



# गण्डकी प्रदेश सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, पोखरा, नेपाल

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय  
स्याङ्जा, नेपाल

आ.व. २०८०/८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति

मिति: २०८०/०८/१७

स्थान: उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी  
मन्त्रालयको सभाहल


प्रस्तुतकर्ताको नाम :  
हरि प्रसाद तिमिल्सिना, सि.डि.ई.



## १. कार्यालयको संक्षिप्त विवरण

शिर्षक	विवरण
परिचय	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा
कार्यक्षेत्र	स्याङ्गजा र कास्की जिल्ला
कार्यालयको अवस्था	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्गजा, पुतलीखेत स्याङ्गजा आफ्नै भवन बाट सेवा दिइएको इकाई कार्यालय अन्तर्गत पोखरा-१७ ड्यामसाइड बाट भाडाको घरबाट सेवा दिइएको

# कार्यालयको संक्षिप्त विवरण ( सङ्गठनात्मक चार्ट)

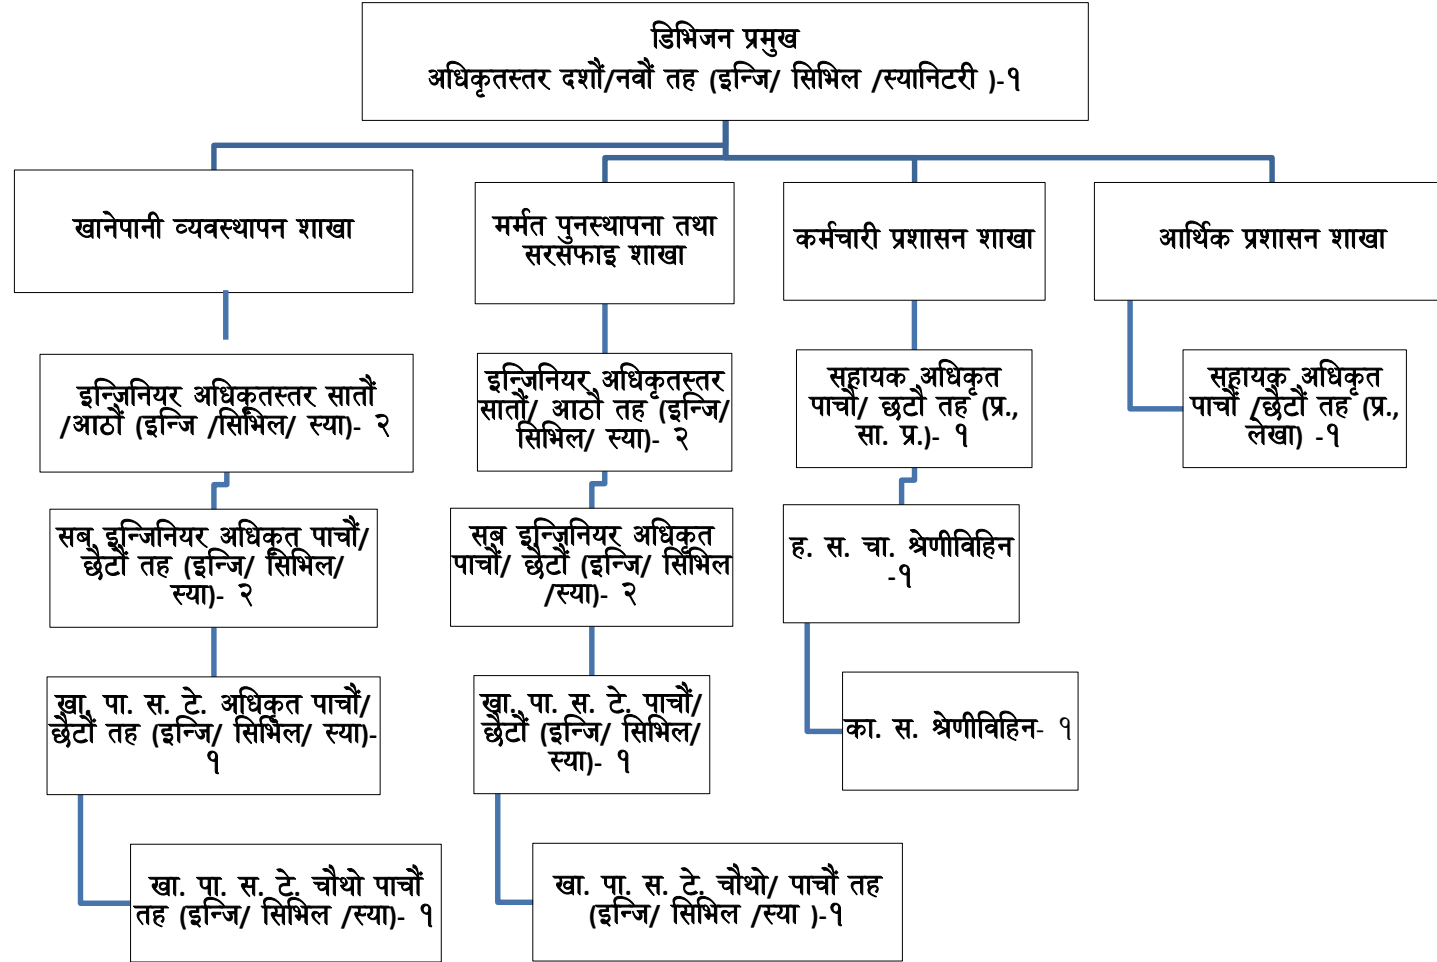

दरवन्दी  
सम्बन्धी  
जानकारी

जम्मा -१८ जना  
स्थायी पदपुर्ती हुन बाँकि - इन्जिनियर -३ जना  
सब इन्जिनियर-२ जना



## २.१ प्रगति विवरण (समष्टिगत)

### पहिलो चौमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क्र.सं	बजेटको किसिम	प्रथम चौमासिक बजेट	खर्च	प्रगति प्रतिशत %	
				वित्तिय	भौतिक
२	पुँजीगत	१०९३०२	८९८२९	८२.१८	९०
	जम्मा	१०९३०२	८९८२९	८२.१८	९०



## २.२ प्रगति विवरण (स्रोतगत)

### वार्षिक बजेटको तुलनामा

रकम रु. हजारमा

बजेटको किसिम	प्रदेश (विशेष सहित)				संघ				औसत ( प्रदेश +संघ )			
	बजेट रकम	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	बजेट रकम	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	बजेट रकम	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
पूँजीगत	३९२३००	४४३६३	११	१५	१५४२१०	४५४६६	२९	३५	५४६५१०	८९८२९	१६.४४	२५



# ३.१ प्रगति विवरण (क्षेत्रगत)

## प्रदेश/ संघिय कार्यक्रम

रकम रु. हजारमा

सि. नं	क्षेत्र	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट		सम्पन्न योजना संख्या	मुख्य उपलब्धि (धारा जडान)	खर्च	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति		क्रमागत हुने योजना संख्या
			चौमासिक	वार्षिक				चौमासिक	वार्षिक	चौमासिक	वार्षिक	
१	संघीय शसर्त	७६	७८४६०	१०७४००		३२५	४५४६६	८०	४२	१००	४२	७६
२	विशेष अनुदान	२	०	०								२
३	प्रादेशिक खानेपानी	३२४	२१४८०	३९२३००		४००	४४३६३	१००	२५	८०	११	३२४
४	संघिय पुनास्थापना	६६	९३६२	४६८१०								६६
	<b>जम्मा</b>	४६८	१०९३०२	५४६५१०	०	७२५	८९८२९	९०	२५	८२	१६	४६८





## ५. कार्यक्रम/आयोजनाको भौतिक प्रगतिको सारांश

सि. नं	कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगति	कार्यक्रम/आयोजनाको संख्या	कुल कार्यक्रम/आयोजनाको प्रतिशत
१	८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	८०	१७.०९
२	५० देखि ७९.९९ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	१००	२१.३७
३	५० प्रतिशत भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	१५०	३२.०५
४	बजेट विनियोजन भएका र कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रम/आयोजना	७०	१४.९६
५	यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रम हरुको संख्या	६८	१४.५३
६	पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P 1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको जम्मा संख्या	४६८	१००
	जम्मा (कार्यक्रम/आयोजनाको संख्या र प्रगति प्रतिशतमा)		





## ६.५ उपलब्धि

खानेपानी सम्बन्धि अवस्था (आ.व. ०७९/८० सम्मको) :

कार्यक्रम	संरचना निर्माण							Coverage (%)					
	Head works	treatment plant	Transmission pipeline	RVT	Distribution pipeline	Tap	Other structures (CC/ DC/ VC/ pump house/ compound wall etc)	Basic	Medium to high	Total			
								Kaski	Syangja	Kaski	Syangja	Kaski	Syangja
प्रदेशिक आयोजना	२७६	४	४४२.९	३१९	४००	१०३३४	३४०						
प्रदेशिक विशेष योजना	७	२	१५.१	१	२०	७५१	९	८२.	८७	१०	८	९२	९५
संघ सशर्त	१११	०	२३८.३	१३२	१८६	१३०९१	१८१						
जम्मा	३९४	६	६९६	४५२	६०६	२४१७६	५३०						



## ६.५ उपलब्धि

खानेपानी सम्बन्धि अवस्था (आ.व. ०८०/८१) :

कार्यक्रम	संरचना निर्माण							Coverage (%)						
	Intake	treatment plant	Transmission pipeline	Distribution pipeline	RVT	Tap	Other structures (CC/ DC/ VC/ pump house/ compound wall etc)	Basic		Medium to high		Total		
								kaski	syangja	kaski	syangja	kaski	syangja	
प्रदेशिक आयोजना	५		७.८		१०	४००	२५							
प्रदेशिक विशेष योजना			१.					८२.०५	८७.०५	१०	८	९२.०५	९५.०५	
संघ सशर्त	६		६.		५	३२५	१०							
जम्मा	११	०	१५	०	१५	७२५	३५							



## ११.१ कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाइ

- उपभोक्ता समिति जागरुक भएको आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सहज र छिटो सम्पन्न हुने पाइयो ।
- आयोजनाहरूमा मूल तथा अन्य बिबाद र दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय तह संग समन्वयन गरि कार्य गर्दा फलदायी हुने देखियो ।
- आयोजनाहरूमा धारा (stand post ) निर्माण कार्य नगर्दा आयोजना कम लागत र छोटो समयमा सम्पन्न हुने पाइयो ।
- लिफ्टिंग आयोजनाहरूमा बिधुतिकरण कार्य (electromechanical works) प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सैदान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सो सम्बन्धि तालिम आवश्यक रहेको



## ८.१ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

### समस्याहरू

- आयोजनामा लागत अनुमानको तुलनामा बिनियोजित बजेट न्यून भई सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने (लिफ्टिंग आयोजनाहरू)
- संघीय खानेपानी कार्यालय बाट पुनस्थापना कार्यक्रम बाट प्रदेश मा आएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन मा न्यून बजेट तथा अत्रौलता
- केहि योजनाहरूमा मुहान/जग्गा विवाद भइ कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ।



## ८.२ समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

### प्रयासहरू:

- दोहोरोपन भएका योजनाहरूको हकमा स्थानीय तह, संघीय खानेपानी कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान लगायतसँग समन्वय गरि कार्य अगाडी बढाइएको ।
- मुहान विवाद र समिति विवाद भएका योजनाको हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि कार्य अगाडी बढाइएको ।
- विभिन्न आयोजनाहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि निर्माण पूर्व तालिम संचालन गरि जनश्रमदान तथा निर्माण कार्य गर्न उत्प्रेरित गराइयो ।



## द.३ समस्या समाधानार्थ सुझावहरू

- आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने ।
- संघबाट हस्तान्तरित र प्रदेश स्तरीय क्रमागत आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।



## ८.४.प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिमा छलफल गर्नुपर्ने समस्याहरू

- आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ।
- लिफ्टिंग आयोजनाको दिगो रूपमा संचालनका लागि प्रादेशिक तहबाटै छुट्टै कार्यक्रमको व्यवस्था गरि आपतकालीन मर्मत तथा सम्भारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने





ढोरबेसी मालेपाटन खा.पा.  
आ., पोखरा-३२,  
को उद्घाटन  
३६४ घरधुरी लाभान्वित





काउडाँडा बृहत खा.पा.आ. कास्की





बेलचौर खा.पा. आ. चापाकोट स्याङ्गजा





हिरापाटा खा पा आ, पुतलीबजार १३  
स्याङ्गजा







नौबिसे खा.पा. आ., गल्यंग- ११ को उद्घाटन कार्यक्रम  
३५ घरधुरी लाभान्वित





**धन्यावाद**
